
๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน

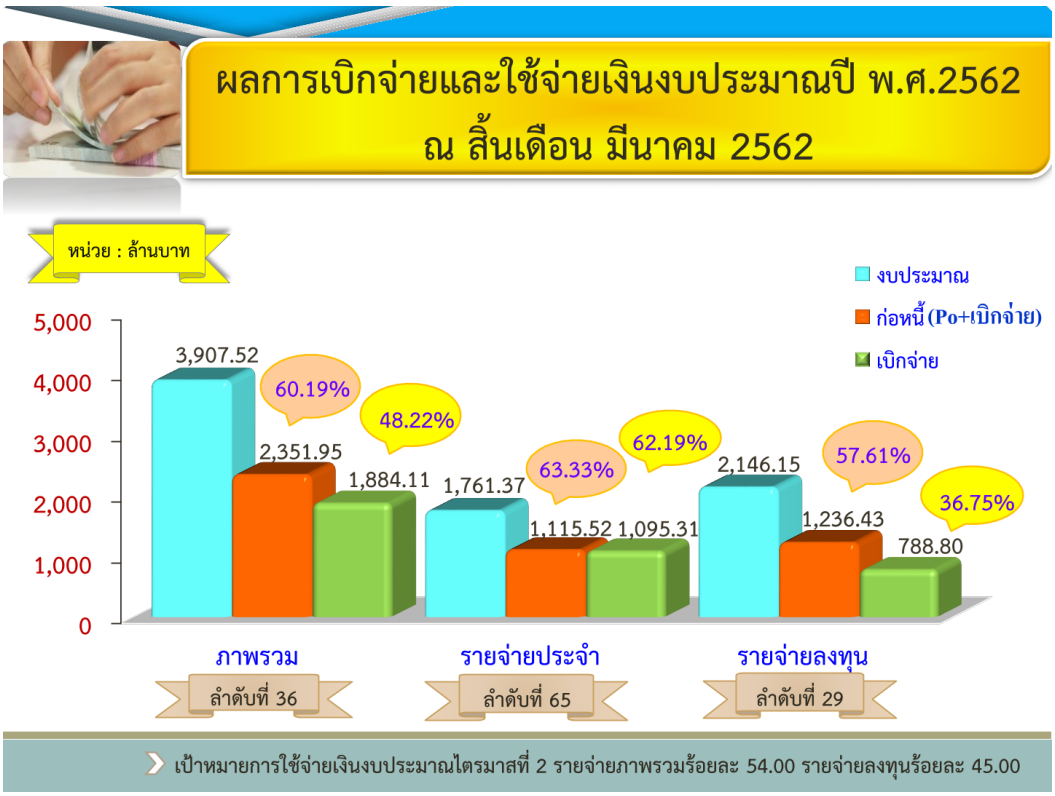

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นการวัดความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการจัดการงบประมาณของจังหวัดในแต่ละช่วงเวลา ถึงการกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงการประหยัดงบประมาณ โดยในภาพรวมของจังหวัดแพร่ ในห้วงเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. **ในภาพรวม** (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๓,๙๐๗.๕๒ ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ รวม ๓,๙๐๗.๕๒ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๘ และรายจ่ายลงทุน รวม ๒,๑๔๖.๑๕ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๒ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม ๓,๙๐๗.๕๒ ล้านบาทนั้น จังหวัดดำเนินการตามเป้าหมายในภาพรวมโดยก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายร่วมกันแล้ว รวม ๒,๓๕๑.๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๙ หากมองเฉพาะการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น รวม ๑,๘๘๔.๑๑ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๒ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว พบว่า จัดอยู่ในลำดับที่ ๓๖ และเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมที่ส่วนกลางกำหนดไว้ ณ ร้อยละ ๕๔.๐๐ จึงสรุปได้ว่า จังหวัดมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ นี้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถึงร้อยละ **๖.๑๙**

๒. **ด้านรายจ่ายประจำ** พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม ๑,๗๖๑.๓๗ ล้านบาท จังหวัดดำเนินการตามเป้าหมายในภาพรวมโดยก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายร่วมกันแล้ว รวม ๑,๑๑๕.๕๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ หากมองเฉพาะการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น รวม ๑,๐๙๕.๓๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๙

/๓. ด้านรายจ่ายลงทุน พบว่า...

๓. **ด้านรายจ่ายลงทุน** พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม ๒,๑๔๖.๑๕ ล้านบาท จังหวัดดำเนินการตามเป้าหมายในภาพรวมโดยก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายร่วมกันแล้ว รวม ๑,๒๓๖.๔๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๑ หากมองเฉพาะการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น รวม ๗๘๘.๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๕ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว พบว่า จัดอยู่ในลำดับที่ ๒๙ และเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมที่ส่วนกลางกำหนดไว้ ณ ร้อยละ ๔๕.๐๐ จึงสรุปได้ว่า จังหวัดมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ นี้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถึงร้อยละ **๑๒.๖๑**

เป้าหมายการพัฒนาต่อไป มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมายังไม่สามารถก่อนหนี้ผูกพันได้ทันตามกำหนด ดังนี้

สรุป เงินงบประมาณงบลงทุนที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร แต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31 มีนาคม 2562)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	เงินประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก	848,000.00	รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
2	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	1.) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อทย.ขุนสถาน	7,482,000.00	ไม่มีผู้เสนอราคา
		2.) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อทย.ถ้ำสะเกิน	11,427,000.00	รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
3	สำนักจัดการป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	1.) เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40 x 40 เมตร จัง	777,800.00	รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
		2.) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้และบริ	1,284,100.00	ไม่มีผู้เสนอราคา
4	สำนักงานจังหวัดแพร่ (งบกลาง)	1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสันทะยอม ม.1 ตงดำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่	1,256,800.00	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากจังหวัด
		2.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจ้อย ม.4 ต.หนองม่วงไข่	4,000,000.00	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากจังหวัด
		3.) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ.ห้วยลากปืน ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย	2,540,000.00	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากจังหวัด
		4.) โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปงป่าหวาย ม.7 อ.เด่นชัย	1,300,000.00	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจากจังหวัด
5	สำนักงานส่งเสนิมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1.) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย	1,490,000.00	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่เพียงพอ เปลี่ยนจากหมู่ 2 เป็น ม.7 บ้านแพะทุ่งเจริญ
		2.) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาช้าง) ม.1 บ้านศรีดอนชัย ต.ทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว 9 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร อ.บ.ต.ทุ่งแล้ง	330,000.00	รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
		3.) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาช้าง) ม.2 บ้านทุ่งแล้ง ต.ทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว 9 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร **อ.บ.ต.ทุ่งแล้ง**	330,000.00	รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
		4.) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ มข. 2527 ม.1 บ้านม่วงคำ ต.สรอย	700,000.00	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากหมู่ 1 เป็น หมู่ 2 เนื่องจากได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนกับกรมการปกครอง รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
		5.) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านบวกโป่ง ต.น้ำชำ อ.บ.ต.น้ำชำ	452,000.00	ทบทวนราคากลางใหม่
		6.) ก่อสร้างคาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,2,3,4 ต.แม่ตำมี	924,000.00	ขอแก้ไขข้อความชื่อโครงการ
		7.) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ เทศบาลเด่นชัย	2,400,000.00	รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	เงินประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
6	เรือนจำจังหวัดแพร่	บ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น พร้อมสิ่ง	5,260,000.00	รอลงนามในสัญญา
7	สพป.แพร่ เขต 1	ครุภัณฑ์ 150 รายการ	9,907,300.00	อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding ครั้งที่ 3
8	สพป.แพร่ เขต 2	ครุภัณฑ์ 90 รายการ	2,209,400.00	อยู่ระหว่างรอลงนาม
9	โรงเรียนพิริยาลัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ โรงเรียนพิริยาลัย	1,000,000.00	ได้รับจัดสรร 1 พ.ค.62
10	สพม.เขต 37 แพร่-น่าน	1.) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รร.สรอยเสรี จังหวัดแพร่	2,094,700.00	รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
		2.) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์ (ขยายผล 62-63) งบประมาณ 40,767,000.บาท	8,153,400.00	ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 3
		3.) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่นๆโรงเรียนศรีสวัสดิ์	1,000,000.00	ได้รับจัดสรร 1 พ.ค.62
11	วิทยาลัยชุมชนแพร่	ค่าก่อสร้างระบบประปา ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่	2,887,000.00	ประกาศ e-bidding
12	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	1.) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2	17,510,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
		2.) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล	37,604,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
		3.) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลวังชิ้น	2,100,000.00	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
		4.) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่	2,100,000.00	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
		5.) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	2,100,000.00	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
		6.) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลลอง	2,100,000.00	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
		7.) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ fibre สำหรับอุปกรณ์จ	700,000.00	รอผลอนุมัติการใช้จาก ICT กระทรวง
		8.) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำนัก	1,050,000.00	รอผลอนุมัติการใช้จาก ICT กระทรวง
		9.) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	570,000.00	รอผลอนุมัติการใช้จาก ICT กระทรวง
		10.) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3	270,000.00	รอผลอนุมัติการใช้จาก ICT กระทรวง
13	งบจังหวัดแพร่			
	1.แขวงทางหลวงชนบทแพร่	1.) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองขลประทาน ซอย 37 ฝั่งขวา ม.1 ต.แม่จั๋ว อ.เด่นชัย	8,123,000.00	มีการเปลี่ยนแปลง หน่วยดำเนินการจาก อ.เด่นชัย เป็นแขวงทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2
		2.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.9 บ้านถิ่น-แพะเมืองผี อ.เมือง	3,500,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	เงินประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
		3.) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายแยก ทล.101-ตำบลกาญจนา อ.เมือง จ.แพร่	4,800,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		4.) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.หัวเมือง กับ ม.1 ต.แดนชุมพล อ.สอง	3,770,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
	2.แขวงทางหลวงแพร่	1.) ปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 1125 ตอนนาปลากั้ง-วังชิ้น กม.47+500-48+500	489,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ
		2.) ปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 1023 ตอนแยกแม่แขม-วังชิ้น กม.64+400-65+400	496,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ
		3.) ปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 1124 ตอนควบคุม 0200 ตอนปางกุ่ม-วังชิ้น กม. 47+000-48+000	481,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ
		4.) ปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 1154 ตอนควบคุม 0100 ตอนสองแก่งเสือเต้น กม. 5+000-7+000	494,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ
		5.) งานซ่อมไฟกระพริบเตือนจุดอันตรายทางหลวงหมายเลข 11 ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะ(ตอน 1) กม.351+740-370+001	495,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		6.) งานซ่อมไฟกระพริบเตือนจุดอันตรายทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางเคา-ปางมะโอ (ตอน 2) กม.385+000-420+066	490,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		7.) งานซ่อมไฟกระพริบเตือนจุดอันตรายทางหลวงหมายเลข 129 ตอนเลี่ยงเมืองแพร่ กม.0+000-10+418	495,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		8.) งานซ่อมไฟกระพริบเตือนจุดอันตรายทางหลวงหมายเลข 1134 ตอนโจ้โก้+บ้านเวียง กม.7+786 (ด้านขวาทาง)	231,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	เงินประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
		9.) งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอนแม่ยางฮ่อ-แม่ตีบ กม.7+700-กม.7+936	33,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		10.) งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนหนองน้ำเขียว-ป่างเคาะ กม.379+100-กม.379+335	499,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		11.) งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอนสวนเงือน-ปากห้วยอ้อย กม.10+945-กม.11+285	488,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		12.) งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแพร่-แยกแม่แขม กม.9+200-กม.9+450	498,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
		13.) งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอนแม่ยางฮ่อ-แม่ตีบ ตอน2 กม.31+775-กม.32+000	499,000.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน เมษายน 2562อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding
	3.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	1.) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกวัดจอมสวรรค์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว	12,240,000.00	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก
		2.) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	6,849,000.00	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก
	4.อำเภอเมือง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ห้วยม้า อ.เมือง	4,230,000.00	
รวมทั้งสิ้น			**185,357,500.00**	

มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมายังไม่สามารถก่อนหนี้ผูกพันได้ทันตามกำหนด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบไปด้วยกลุ่มแรก **งบหน่วยงาน** มีส่วนราชการ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และ กลุ่มที่สอง **งบจังหวัดแพร่** มีส่วนราชการ จำนวน ๔ หน่วยงาน ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน รวมทั้งสิ้น ๑๘๕,๓๕๗,๕๐๐ บาท จังหวัดจะได้ดำเนินการเร่งรัดเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ต่อไป
